



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto

Gerencia de Operaciones y Logística
Dirección de Unidad de Mina

Marzo 02 2025

ternel



Contenido

Descripción

Imágenes

DESCRIPCIÓN

Como parte del recorrido rutinario que hacemos a la línea del oleoducto y con la finalidad de verificar el alineamiento. Todas las válvulas se mantienen abiertas. Presión en la línea del oleoducto 1,352.68 Kpa . Presión en la entrada del tanque de MSA 11.58 kpa Las presiones se mantienen estables.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (Válvulas KM 3.57/5.17)



Válvulas check valves 3.57 km mantiene abierta, 5.17 km se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (Válvulas KM 7.47/8.90)



Válvulas check valves 7.47 km mantiene abierta, 8.90 km se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (Válvulas KM 10.83/11.62)



Válvulas check valves 10.83 km y 11.62 km se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA Recorrido del oleoducto (Válvulas Puente Río Uvero)



Válvulas de compuerta río Uvero se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (Válvulas KM 13.55)



Válvulas check 13.55 se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (Válvulas KM 14.00/14.97)



Válvulas check valves 14.00 km mantiene corrosión, necesita ser pintada con pintura anticorrosiva.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (Río del medio)



Válvulas de compuerta río del medio se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (Válvulas 17.4)



Válvulas del km 17.4 se mantienen abiertas.

 Operación Terpel en MPSA
Recorrido del oleoducto (19.8 Km)



Válvulas del km 19.8 se mantiene abierta.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto (Punto de reparación)



En el punto de reparación permanece estable.

 Operación Terpel en MPSA
Recorrido del oleoducto (21.0 km)



Válvulas del km 21.0 (Emulsión) se mantiene abierta.

 Operación Terpel en MPSA
Recorrido del oleoducto (Emulsión)



Válvulas de (Emulsión) se mantiene abierta.

 Operación Terpel en MPSA
Recorrido del oleoducto (22.8 km)



Válvulas del km 22.8 se mantiene abierta.

 Operación Terpel en MPSA
Recorrido del oleoducto (23.8 km) CSA



Válvulas del km 23.8 se mantiene abierta.

Operación Terpel en MPSA



Recorrido del oleoducto (29 km) MSA



Válvulas del km 29 se mantiene abierta.

Operación Terpel en MPSA

Presiones

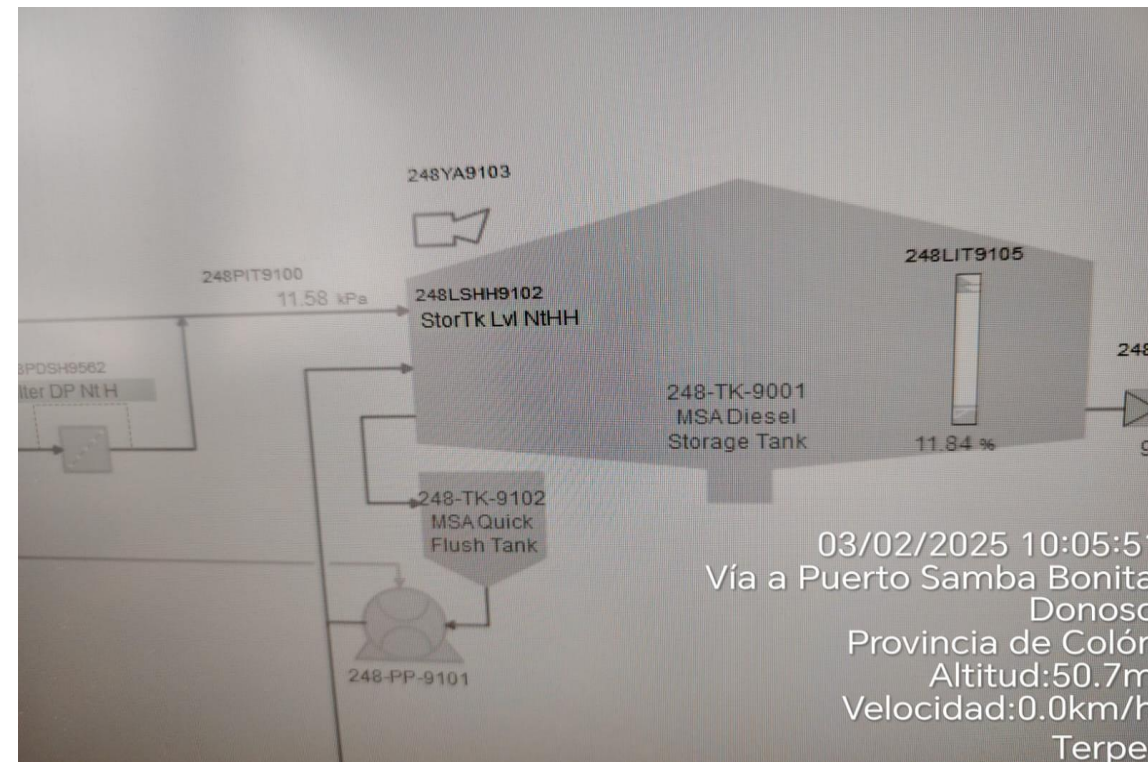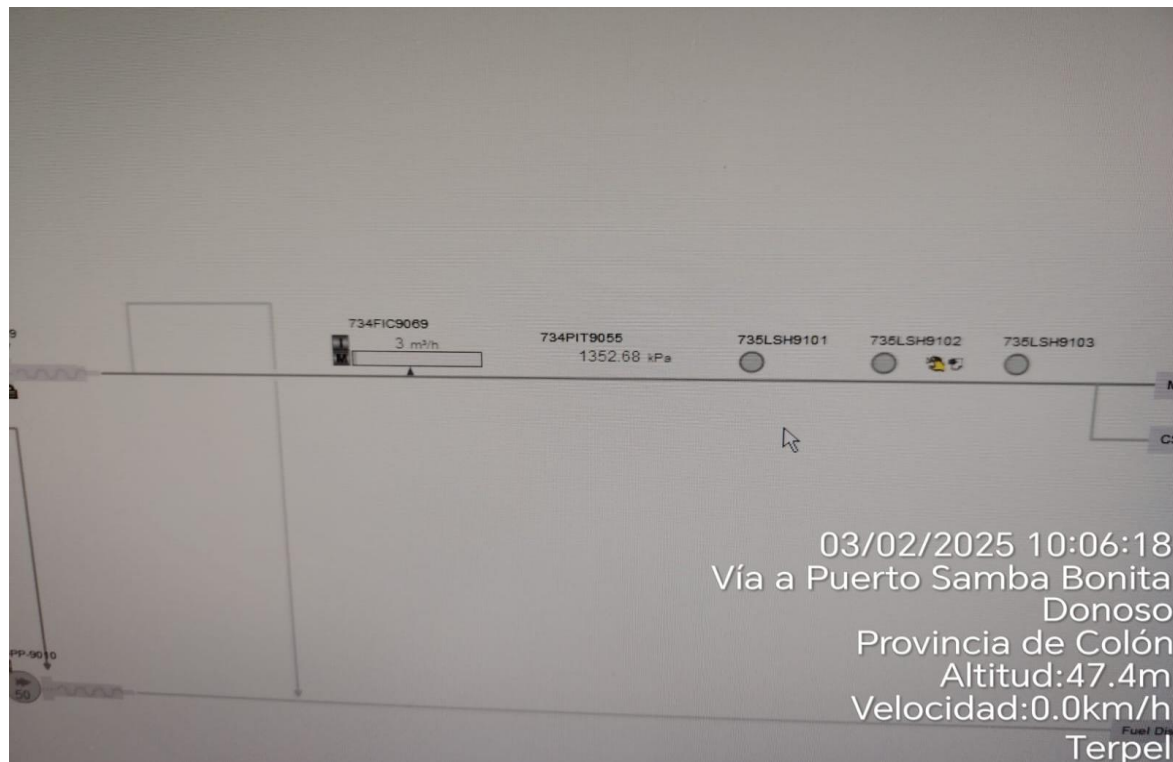

Las transferencias del mes de febrero 2025 suman un total de 271,718 litros. Estas transferencias fueron realizadas los días: 3, 10, 13, 15, 20, 25 y 28 de febrero 2025.

Porcentaje de tanque 9001 Prit:	19.90%
Porcentaje de tanque 9002 Prit:	5.00%
Porcentaje de tanque MSA:	11.84%
Inventario de tanque MSA:	674,051Lts
Inventario Utilizable MSA:	86,198 Lts



Gracias

terpel
